



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: *Lavori per la realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Monterosso Almo. – Attuazione del PO FESR Sicilia 2007 – 2013 Obiettivo Operativo 1.2.3. linea di intervento 1.2.3.3. (catg 29) CUP B 96 111 000590002: Approvazione quadro economico definitivo e Attestazione chiusura e coerenza dell'intervento.*

		PRESENTI	ASSENTI
SALVATORE PAGANO	Sindaco	<u>X</u>	<u> </u>
DIBENEDETTO SALVATORE	Assessore	<u>X</u>	<u> </u>
DIBENEDETTO GAETANO	Assessore	<u> </u>	<u>X</u>
SCOLLO MARIA GRAZIA	Assessore	<u>X</u>	<u> </u>

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 16:30 e s.s.

nella Residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale.

Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il

Sindaco Dott. Salvatore Pagano con l'assistenza del Vice Segretario Comunale

Dott. Salvatore Iucolano

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Responsabile Area Tecnica avente ad oggetto: "Lavori per la realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Monterosso Almo. – Attuazione del PO FESR Sicilia 2007 – 2013 Obiettivo Operativo 1.2.3. linea di intervento 1.2.3.3. (catg 29) CUP B 96 111 000590002: Approvazione quadro economico definitivo e Attestazione chiusura e coerenza dell'intervento" nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm. ii.;

Vista la L.R. 48/91 e ss.mm. ii.;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Bilancio di previsione 2017 in corso di formazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, allegata alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo con separata ed unanime votazione

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE


Area Tecnica

Ufficio Proponente: Servizio Opere Pubbliche

L'Assessore Proponente: _____

Oggetto: Lavori per la realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Monterosso Almo.
Attuazione del PO FESR Sicilia 2007- 2013 Obiettivo Operativo 1.2.3. linea di intervento
1.2.3.3. (catg 29) CUP B 96 111 000590002 : Approvazione quadro economico definitivo e
Attestazione chiusura e coerenza dell'intervento.

Il Responsabile A.T.

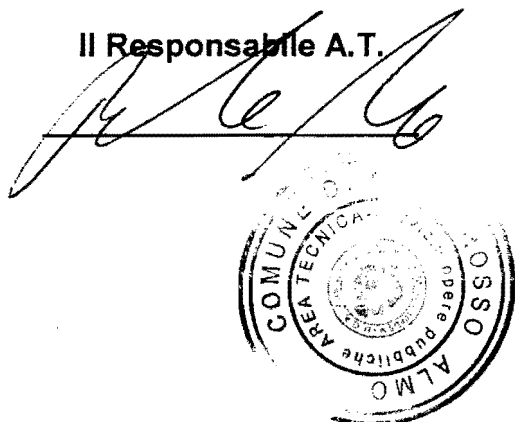



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

C.A.P. 97010 - P.I. - 00177300886

C.F. 92005940884

Tel. 0932 970261 - 0932 970262

Prot. AT. 2114 del 28/12/2014 n. reg. 35

PROPOSTA DI DELIBERA DELLA G.M.

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Monterosso Almo. Attuazione del PO FESR Sicilia 2007- 2013 Obiettivo Operativo 1.2.3. linea di intervento 1.2.3.3. (catg 29) CUP B 96 111 000590002 : Approvazione quadro economico definitivo e Attestazione chiusura e coerenza dell'intervento. -

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Premesso che con nota prot. 3122 del 3/06/2011 il Sindaco ha disposto la partecipazione al bando pubblico di attuazione del PO FSR Sicilia 2007-2013 Obiettivo Operativo 1.23. Linea di intervento 1.2.3.3. "Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete (catg.29)" pubblicato sulla G.U.R.S. n. 22 del 20/05/2011,;

Che al fine della partecipazione a detto bando ed accertata la carenza di organico all'interno di questa Amministrazione, allo scopo di procedere alla redazione del progetto definitivo e successivo sviluppo in progetto esecutivo, è stata esperita gara mediante procedura negoziata ad evidenza pubblica in data 29/06/2011, risultando aggiudicatario il dott. arch. Giuseppe Liuzzo residente a Mistretta nella via Nazionale n. 25 cod. fisc. LZZGPP62S11F251R e p.IVA 0167940836, con il ribasso del 61,80%, incarico successivamente formalizzato con disciplinare Rep. 1760 del 12/09/2014, registrato a Ragusa il 19/09/2014 al n. 2287;

Con delibera della Giunta Municipale n. 171 del 04/11/2011 è stato approvato il progetto esecutivo, per l'importo complessivo di € 400.000,00 dei quali € 311.432,75 per lavori a base d'asta ed € 88.567,25 per somme a disposizione dell' Amministrazione con il seguente quadro economico generale ;

A) per lavori		
A1) Per lavori	€	311.432,75
A2) Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.048,36
A3) Restano i lavori a base d'asta	€	<u>304.384,39</u> <u>304.384,39</u>

B) Per somme a disposizione		
B1) Per IVA al 10% su A3)	€	31.143,28
B2) Per imprevisti ed arrotondamenti 2,60%	€	8.083,71
B3) Per competenze tecniche compresa IVA ed oneri	€	29.890,22
B4) Per competenze geologo compreso IVA ed oneri	€	5.360,72
B5) Per indagini e prove geognostiche		3.532,16
B6) Per spese di pubblicazione bando ed esito di gara	€	3.500,00
B7) Per spese accatastamento compreso IVA ed oneri	€	2.500,00
B8) Per competenze del R.U.P.	€	1.557,16
B9) Per oneri di conferimento a discarica	€	3.000,00
Totale somme a disposizione	€	<u>88.567,25</u> <u>88.567,25</u>
Importo complessivo del progetto	€	<u>400.000,00</u>

Che i lavori venivano ammessi a finanziamento giusto D.D.G.*n. 119 del 23/04/2012 emesso dalla Presidenza della Regione Sicilia, Dipartimento della Protezione Civile e registrato alla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione in data 22/05/2012 per l'importo complessivo di € 400.000,00 con impegno al Cap. 516060 del bilancio Regionale

Che a seguito di procedura negoziata esperita dal 4/06/2013 all'8/07/2013 è risultata aggiudicataria l'impresa ITAL COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Gela nella via Morselli n. 38 con il ribasso del 30,0332 %, le operazioni di gara venivano approvate con determina dirigenziale n. 403 del 24/09/2013 del Registro Generale (n. 84 del 23/09/2013 del Registro Particolare) con contestuale aggiudicazione definitiva a favore della suddetta impresa ITAL COSTRUZIONI s.r.l , ed approvazione del quadro economico generale post gara come di seguito

A) per lavori		
A1) Per lavori al netto del ribasso offerto del 30,0332%	€	212.968,02
A2) Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.048,36
A3) Restano i lavori a base d'asta	€	<u>220.016,38</u> <u>220.016,38</u>
B) Per somme a disposizione		
B1) Per IVA al 10% su A3)	€	22.001,64
B2) Per imprevisti ed arrotondamenti 2,60%	€	8.083,71
B3) Per competenze tecniche compresa IVA ed oneri accessori	€	29.890,22
B4) Per competenze geologo compreso IVA ed oneri accessori	€	5.360,72
B5) Per indagini e prove geognostiche	€	3.532,16
B6) Per spese di pubblicazione bando ed esito di gara	€	3.500,00
B7) Per spese accatastamento compreso IVA ed oneri	€	2.500,00
B8) Per competenze del R.U.P.	€	1.557,16
B9) Per oneri di conferimento a discarica	€	3.000,00
Totale somme a disposizione	€	<u>79.425,61</u> <u>79.425,01</u>
Importo complessivo	€	<u>299.441,99</u>

e quindi con una economia di € 100.558,01 rispetto alle previsioni originarie

Che con D.D.G. n. 545 del 26/11/2013 emesso dal Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile si è proceduto al disimpegno delle economie come sopra indicate;

Che con contratto di appalto Rep. 1757 del 3/12/2013 registrato a Ragusa in data 20/12/2013 al n. 2892 i lavori sono stati affidati all'impresa "Italcostruzioni s.r.l." con sede in Gela (CL) nella via Morselli n. 18, per l'importo di € 220.016,38 al netto del ribasso del 30,0332% ;

Che i lavori sono stati consegnati in data 07/02/2014, i quali in applicazione dell'art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto dovevano darsi conclusi entro il 06/07/2014;

Che durante il corso dei lavori la direzione dei lavori, in applicazione ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.lgvo 263/2006 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 Luglio 2011 n. 12 , e dell'art. 161 del Regolamento approvato con D.R.P 5 ottobre 2010 n. 207, ha redatto una perizia di variante e di assestamento all'interno dell'importo complessivamente disponibile come rideterminato a seguito dell'emissione del D.D.G. n. 545 del 26/11/2013 di disimpegno delle economie derivanti dal ribasso contrattuale, con il seguente quadro economico

A) Per lavori al netto del ribasso contrattuale e compresi € 7.048,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	219.738,09
B) Per somme a disposizione		
B1) Per IVA sui lavori 10% su A)	€	21.973,81
B2) Per competenze tecniche compresa IVA ed oneri previdenziali	€	35.787,09
B3) Per spese di accatastamento compresa IVA ed oneri previdenziali	€	2.500,00
B4) Per incentivi ex art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/06 e s.m.i (attività del RUP)	€	1.555,18
B5) Per oneri conferimento a discarica autorizzata	€	17.741,97
Totale somme a disposizione	€	79.558,05
Importo complessivo	€	299.296,14
Importo definitivamente finanziato	€	299.441,99
Restano economie		145,85

e quindi con una ulteriore economia pari ad € 145,85.

Che la perizia citata veniva approvata ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 con determina dirigenziale n. 354 del 19/05/2014 del Registro Generale (n. 70 del 19/05/2014 del Registro Particolare) con successiva stipula dell'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi in data 15/05/2014 ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 7 come recepito con la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e registrato ai fini fiscali presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina – Ufficio Territoriale di S. Agata di Militello- sportello di Mistretta in data 16/05/2014;

Che i lavori sono stati ultimati in data 26/06/2014 entro il termine utile contrattuale.

Che in data 05/09/2014 il direttore dei lavori ha redatto lo Stato Finale dei Lavori per l'importo di € 219.738,09 al netto del ribasso contrattuale del 30,0332%, oltre IVA , con un credito netto a favore dell'impresa pari ad € 1.098,69 oltre IVA al 10%;

Che lo Stato Finale così come tutti gli atti riguardanti l'appalto sono stati sottoscritti senza alcuna riserva da parte dell'impresa

Che trattandosi di opere di importo inferiore ad € 500.000 ai sensi dell'art. 141 comma 2 del Dlvo 12 aprile 2006 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 in sostituzione del certificato di collaudo è stato redatto in data 09/09/2014 da parte della D.L. il certificato di regolare esecuzione con autorizzazione alla liquidazione a favore dell'impresa della rata di saldo pari ad € 1.098,69 al netto del ribasso contrattuale ed oltre IVA;

Che il certificato di regolare esecuzione, sottoscritto senza alcuna riserva o eccezione da parte dell'Impresa esecutrice e quindi confermato ai sensi dell'art. 237 comma 2) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 dal Responsabile Unico del Procedimento veniva definitivamente approvato con Determina Dirigenziale n. 202 del 11/03/2015 del Registro Generale (n. 33 del 5/03/2015 del Registro Particolare);

Che sulla base dello Stato Finale dei Lavori il quadro economico consuntivo dell'intervento, è così determinato:

A)	Per lavori al netto del ribasso del 30,0332%,	€	219.738,09
B)	Per somme a disposizione		
B1)	Per IVA al 10% su A)	€	21.973,809
B2)	Per oneri di conferimento a discarica ogni onere compreso	€	17.741,97
B3)	Per competenze tecniche ogni onere compreso	€	35.787,09
B4)	Per incentivi di attività del R.U.P. ogni onere compreso	€	1.557,16
	Totale somme a disposizione	€	77.060,03 77.060,03
	Totale	€	296.798,12
	Importo finanziato	€	299.441,99
	Restano economie definitivamente accertate	€	2.643,87

Che pertanto risulta una ulteriore economia pari ad € 2.643,87 rispetto all'importo finanziato di € 299.441,99 come rideterminato a seguito all'emanazione del D.D.G. n. 545 del 26/11/2013 di disimpegno delle economie derivanti dal ribasso contrattuale IVA compresa;

Ritenuto pertanto che necessita procedere all'approvazione del quadro economico definitivo come sopra riassunto;

-che ai fini della chiusura del PO FESR 2007/2013 presso la Commissione Europea in merito al finanziamento concesso, occorre approvare con apposito atto deliberativo della Giunta Municipale, il Quadro Economico Finale (Q.E.F.) nonché dichiarare la funzionalità dell'opera realizzata ed impegnarsi a rispettare gli OBBLIGHI DI CUI Agli artt. 55 e 57 del Reg. (CE) n.1083/2006 e artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n.1828/2006;

Considerato che :

-risulta quindi necessario procedere all'adozione urgente della presente deliberazione al fine di consentire che l'Assessorato Regionale alla Famiglia proceda alla chiusura dell'intervento;

-in conformità alle normative vigenti in materia e a precise direttive del Competente Assessorato Regionale, i relativi dati economici sono stati inseriti sul portale "Sistema Caronte" della Regione Siciliana e la spesa così rendicontata risulta nel sopra riportato quadro economico;

-il predetto quadro economico risulta coincidente con il Quadro Economico Finale (Q.E.F.) e che in

questa sede, a seguito redazione e sottoscrizione del sottoscritto R.U.P. della relazione conclusiva dell'intervento redatta sulle attività di progetto e di esecuzione con contestuale attestazione di congruità e la coerenza dei lavori e delle forniture con quanto finanziato a valere sul POR, si propongono per la relativa approvazione e per il successivo inoltro al Competente Assessorato Regionale;

Considerato ancora che occorre assumersi la responsabilità di quanto previsto:

-dall'art.57 del Reg. (CE) n.1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, l'immobile, i lavori in esso realizzati e le forniture con il finanziamento, non devono subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;

-dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica e documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione di Sistema Caronte;

-dall'art.55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 si dichiara che l'opera in argomento non costituisce generatore di entrate nette;

-che occorre dichiarare che l'opera (i lavori, le forniture e/o servizi connessi) è funzionante (completato e in uso ossia fruito dai destinatari della Linea d'intervento del PO) alla data odierna;

-che Questo Ente ha provveduto all'inserimento sui "Sistema Caronte" di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

-che si impegna alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva previste dalla normativa vigente) fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;

TUTTO CIO' PREMESSO SI PROPONE Alla G.M.

- Di approvare la relazione conclusiva relativa ai lavori di realizzazione di una elisuperficie come redatta dal R.U.P. ove sono riportati in sintesi i fatti ed pagamenti connessi all'intero ciclo dalla progettazione ai pagamenti ed altresì si attesta la congruità e la coerenza dei lavori e delle forniture con quanto finanziato a valere sul POR;

-di approvare il Quadro Economico Finale (Q.E.F.) del progetto stesso come di seguito riportato:

A)	Per lavori al netto del ribasso del 30,0332%,	€	219.738,09
B)	Per somme a disposizione		
B1)	Per IVA al 10% su A)	€	21.973,809
B2)	Per oneri di conferimento a discarica ogni onere compreso	€	17.741,97
B3)	Per competenze tecniche ogni onere compreso	€	35.787,09
B4)	Per incentivi di attività del R.U.P. ogni onere compreso	€	1.557,16

Totale somme a disposizione	€	77.060,03	77.060,03
Totale	€		296.798,12
Importo finanziato	€		299.441,99
Restano economie definitivamente accertate	€		2.643,87

con una economia complessiva di € 103201,88 rispetto al finanziamento di € 400.000 originariamente concesso con D.D.G. n. 119 del 23/04/2012 e di € 2.643,87 rispetto all'importo rideterminato a seguito del D.D.G. n. 545 del 26/11/2013 di disimpegno della somma di € 100.558,01 conseguente all'applicazione del ribasso contrattuale IVA compresa;

- di dichiarare che il progetto (i lavori, le forniture e/o servizi connessi) è funzionante e in uso

- di assumere le responsabilità derivanti :

-dall'art.57 del Reg. (CE) n.1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, l'immobile, i lavori in esso realizzati e le forniture con il finanziamento, non dovranno subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;

-dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica e documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi, nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione di Sistema Caronte;

-dall'art.55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di entrate nette, che l'opera realizzata non costituisce generatore di entrate;

- di dichiarare che Questo Ente ha provveduto all'inserimento sul "Sistema Caronte" tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

- di impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva previste dalla normativa vigente) fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;

-di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12 della L.R. n.44/91.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Ai sensi dell'art.151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento _____

Cap. _____ del Bilancio _____

Li _____

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000

SI ESPRIME


a) ai fini della regolarità tecnica:

☒ Parere favorevole

☐ Parere contrario

Li 28/12/2017

IL RESPONSABILE



a) ai fini della regolarità contabile:

☐ Parere favorevole

☐ Parere contrario

Li _____

IL RESPONSABILE

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

L'ASSESSORE ANZIANO

Sig. Salvatore Di Benedetto

IL PRESIDENTE

Dott. Salvatore Pagano

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Salvatore Luciani

Reg. Albo n° _____ 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal

al _____

IL MESSO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Monterosso Almo Li _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☐ Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo Preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3.12.1991 n°44 e dell'art. 4 della L.R. 23 del 05/7/1997

☒ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 o 16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

Monterosso Almo, li 28/12/2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

o Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio..... in data.....

Monterosso Almo Li

IL Responsabile del Servizio
